

PLANO ESTRATÉGICO 90 DIAS

Duas marcas pessoais, uma tese central e um sistema comercial para validar a mentoria conjunta de Ana e Pedro com investimento de R\$ 18.000.

15 SET A 13 DEZ 2026

INSTITUTO REGO

VERSÃO VISUAL 1.2



LEITURA EXECUTIVA

O problema não é falta de autoridade. É a ausência de um mecanismo rastreável que transforme atenção em aplicação, venda e entrega sem ampliar a exaustão dos fundadores.

UMA ÚNICA TESE COMERCIAL, DISTRIBUÍDA POR DUAS AUTORIDADES COMPLEMENTARES.

Receita clínica atual

R\$ 130 mil a R\$ 150 mil mensais, com picos de R\$ 200 mil.

Dependência crítica

Indicações e presença direta dos fundadores ainda sustentam o crescimento.

Oportunidade

O braço educacional oferece margem e escala menos dependentes da hora clínica.

Gargalo central

ICP amplo, oferta não productizada, CRM ausente e conteúdo sem rota única de conversão.

NORTE DOS 90 DIAS

8

contratos na primeira turma,
equivalentes a R\$ 144 mil de receita
contratada.

6 contratos: validação

8 contratos: cenário-base

10 contratos: stretch com 2 pré-vendas do
ciclo seguinte

CINCO MOVIMENTOS

A sequência impede que conteúdo e tráfego sejam acelerados antes de produto, qualificação e capacidade.

01

FOCO

ICP, anti-ICP, promessa e mensagem única para clínicas validadas.

02

OFERTA

Escopo de 12 semanas, limites claros e primeira turma de até 8 empresas.

03

AQUISIÇÃO

Duas marcas pessoais, conteúdo 40/40/20 e oferta direta antes da abertura pública.

04

CONVERSÃO

Raio-X, aplicação, sessão estratégica, CRM e follow-up com dados.

05

ENTREGA

Cohort controlada, CS, captura de prova e decisão de escala baseada em capacidade.

O CENTRO DO ALVO



Nos primeiros 90 dias, o Instituto Rego não deve falar com todo profissional de saúde. A comunicação precisa selecionar quem já possui operação e poder de implementação.

ICP OBRIGATÓRIO

- Dono ou sócio-decisor
- Clínica validada
- Serviço vendido e entregue
- Disponibilidade para implementar

MAIOR ADERÊNCIA

- R\$ 60 mil a R\$ 200 mil/mês
- Saúde, estética e bem-estar
- Dependência de indicação
- Fundador sobrecarregado

FORA DO FOCO NESTE CICLO

- Negócios em fase de ideia
- Busca por formação clínica técnica
- Expectativa de resultado financeiro garantido
- Profissional sem poder de decisão ou capacidade de execução

OFERTA PRINCIPAL

Mentoria empresarial para transformar autoridade técnica em uma operação premium com oferta, aquisição, CRM, vendas e gestão.

INVESTIMENTO

R\$ 18K

Preço definido pelo solicitante. Condições de pagamento permanecem como decisão de ativação.


DURAÇÃO	12 semanas
CAPACIDADE	Até 8 empresas na primeira turma
FORMATO	Encontro semanal de 120 minutos em grupo, com Ana e Pedro
INDIVIDUAL	Dois checkpoints de 60 minutos por empresa, com o mentor mais aderente
ATIVOS	Diagnóstico, plano 90D, templates de oferta, conteúdo, CRM, vendas e dashboard
LIMITES	Sem execução integral, suporte irrestrito, revisões ilimitadas ou promessa de faturamento

01 DIAGNÓSTICO Dados, ICP, gargalo e meta.	02 OFERTA Portfólio, ticket, jornada e margem.	03 AQUISIÇÃO Autoridade, conteúdo e campanha.	04 VENDAS Aplicação, call, CRM e follow-up.	05 ESCALA Capacidade, equipe, LTV e próximo ciclo.
---	---	--	--	---

FUNIL REVERSO

Cenários operacionais, não promessas. As taxas serão substituídas pelo baseline real capturado nos primeiros 14 dias.

- VALIDAÇÃO
- BASE
- STRETCH

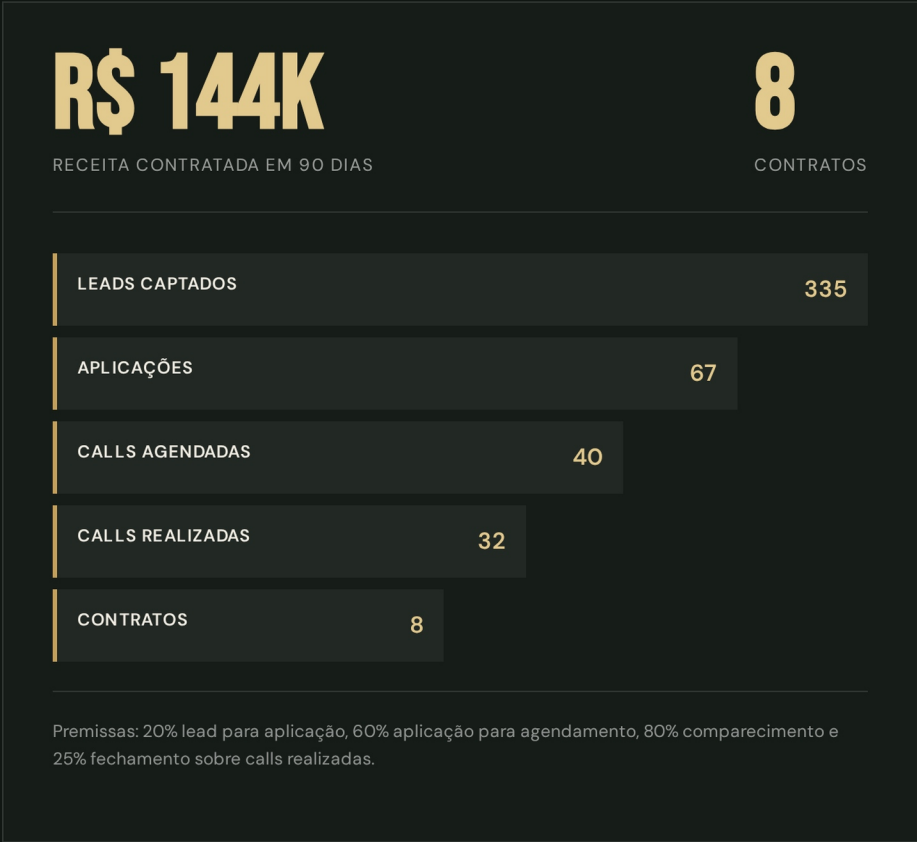

DUAS VOZES, UMA OFERTA

As marcas pessoais não devem publicar cópias uma da outra. Cada fundador ocupa um território próprio e conduz para o mesmo hub institucional.

ANA

EXPERIÊNCIA, ESTÉTICA E POSICIONAMENTO

Percepção de valor, jornada premium, marca, bastidores e decisões empresariais pela lente da experiência.

+

PEDRO

PRODUTO, PERFORMANCE E GESTÃO

Protocolos, valor percebido, indicadores, integração de serviços e decisões empresariais pela lente da operação.

INSTITUTO REGO

REGO ACADEMY

Aplicação única

CRM e atribuição

Método e ativos

Cases autorizados

Eventos conjuntos

Onboarding e entrega

SISTEMA 40/40/20



40%

Topo: atrair

40%

Meio: educar

20%

Fundo: converter

Dez publicações por semana: oito originais nas marcas pessoais e duas derivações institucionais. A frequência serve à tese, não substitui qualidade.

DIA	ANA	PEDRO / INSTITUTO
Segunda	TOPO Experiência premium	TOPO Agenda, margem e gestão
Terça	MEIO Posicionamento e jornada	Gravação e distribuição
Quarta	Live conjunta	MEIO Produto, números e CRM
Quinta	TOPO Quebra de crença	MEIO Case institucional
Sexta	Prova e bastidor	TOPO Visão de negócio
Fim de semana	FUNDO Convite para o Raio-X	FUNDO Aplicação e objeções

ROADMAP 90 DIAS

Quatro fases, cada uma com objetivo, evidência e gate mínimo. Não se avança por calendário quando a condição de qualidade não foi atendida.

D1 A D14

15 A 28 SETEMBRO

FUNDAÇÃO

Resolver foco, produto e infraestrutura.

- 10 entrevistas com ICP
- Oferta e limites aprovados
- CRM e aplicação testados
- 24 conteúdos prontos

GATE: JORNADA PONTA A PONTA ATIVA

D15 A D30

29 SETEMBRO A 14 OUTUBRO

PRIMEIRA CONVERSÃO

Gerar aplicações e vender para a base quente.

- 10 posts por semana
- Oferta direta por 7 dias
- Calls conduzidas pelos fundadores
- Masterclass executiva

GATE: 12 CALLS E 2 CONTRATOS

D31 A D60

15 OUTUBRO A 13 NOVEMBRO

ENTREGA E PROVA

Iniciar a turma e otimizar com evidência real.

- Onboarding e baseline
- 4 a 6 contratos acumulados
- Roleplays e revisão de calls
- Primeiros cases autorizados

GATE: 6 CONTRATOS E SAÚDE DA TURMA

D61 A D90

14 NOVEMBRO A 13 DEZEMBRO

CONSOLIDAÇÃO

Completar a turma e decidir a escala.

- 8 contratos na turma
- Reativação com nova prova
- SOPs documentados
- Até 2 pré-vendas condicionais

GATE: MARGEM, QUALIDADE E PRÓXIMO CICLO


ROADMAP 90 DIAS

Quatro fases, cada uma com objetivo, evidência e gate mínimo. Não se avança por calendário quando a condição de qualidade não foi atendida.

SEMANA	PRIORIDADE	EVIDÊNCIA OBSERVÁVEL
1	Dados e entrevistas	Baseline e cinco entrevistas concluídas
2	Oferta e infraestrutura	ICP, oferta, CRM e aplicação ativos
3	Conteúdo e base quente	10 posts e lista segmentada
4	Oferta direta	10 calls acumuladas e objeções mapeadas
5	Masterclass e vendas	Evento realizado e primeiros contratos
6	Onboarding	Diagnósticos dos participantes concluídos
7	Otimização comercial	Script v2 e score de calls
8	Prova	Primeiras evidências autorizadas
9	Segunda janela	Novo evento e follow-up completo
10	Reativação	Não compradores reclassificados
11	Escala controlada	Teste pago apenas se os gates forem atendidos
12	Documentação	SOPs de conteúdo, CRM e onboarding
13	Fechamento	Dashboard, margem, satisfação e plano seguinte

PIPELINE B2B

A mentoria precisa de pipeline separado dos pacientes. Nenhuma oportunidade ativa pode ficar sem responsável, próxima ação e data.

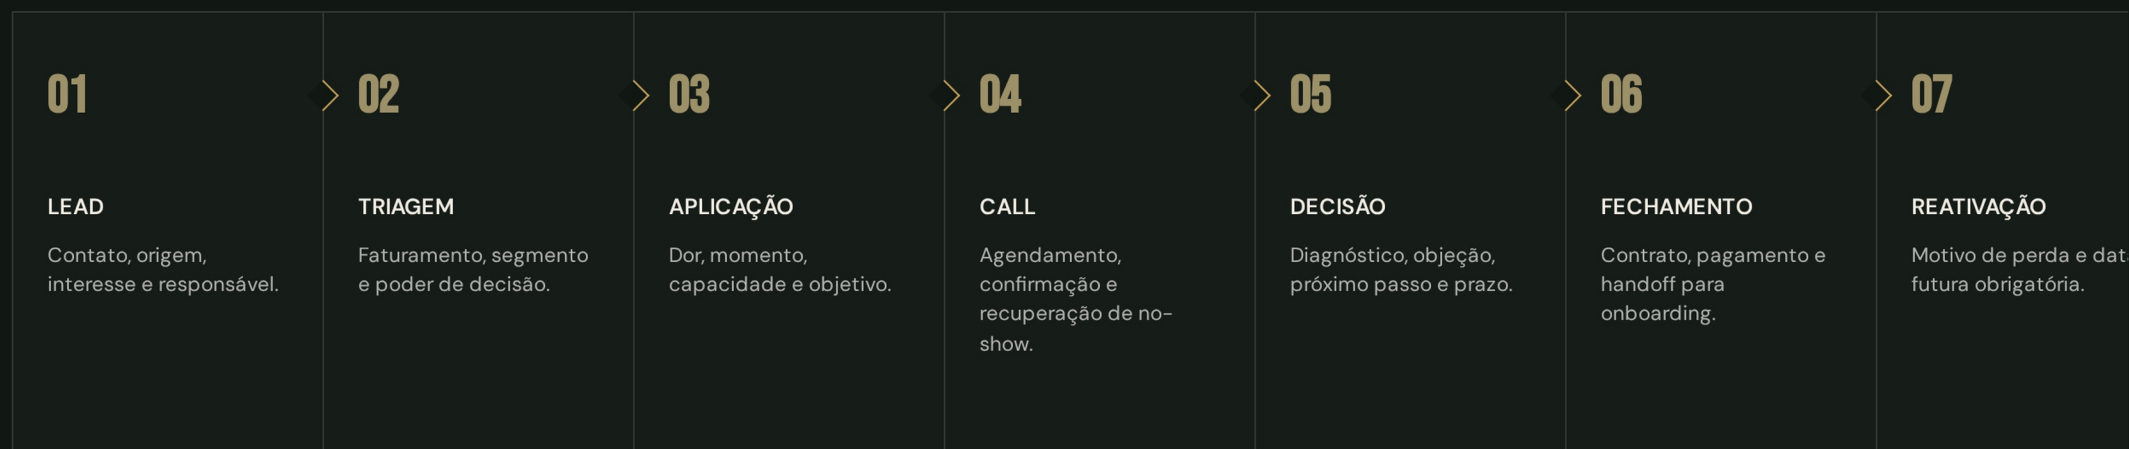

AUTOMAÇÃO Confirmação imediata, lembretes em 24h e 2h, alerta após 48h sem atividade.	QUALIDADE R\$ 50 por agendamento qualificado e comparecido. No-show não é remunerado.	PRIVACIDADE Dados clínicos permanecem no prontuário. O CRM comercial registra somente o necessário para venda B2B.
---	---	--

ESCALA PROTEGIDA

A capacidade é medida em horas combinadas dos dois mentores. O limite inicial protege também o suporte, o retrabalho e o impacto sobre a clínica.

6 empresas



84H

8 empresas



88H

12 empresas



96H

Inclui 12 encontros de 2h com ambos, dois checkpoints individuais por empresa e 2h combinadas semanais de preparo e QA.

PRIMEIRA TURMA RECOMENDADA

8 EMPRESAS

Média de 7h20 combinadas por semana. Ampliar para 12 somente com CS dedicado, margem conhecida, suporte medido e qualidade comprovada.

DASHBOARD DE KPIs

Receita contratada, caixa recebido e receita da clínica permanecem separados.
Toda métrica precisa ter campo de origem e responsável.

AQUISIÇÃO E CONTEÚDO		CONVERSÃO		FINANCEIRO	
Publicações planejadas x realizadas	Semanal	Aplicações qualificadas	Qtd.	Receita contratada	R\$
Distribuição 40/40/20	Semanal	Calls e no-show	%	Caixa recebido	R\$
Leads por Ana, Pedro e Instituto	Diário	Conversão por origem	%	Ticket médio	R\$
Percentual de leads dentro do ICP	Semanal	Ciclo de venda	Dias	CAC e payback	R\$ / dias
CPL e qualidade, quando houver mídia	Campanha	Motivos de perda	Mix	Margem da turma	%
ENTREGA E SAÚDE					
Presença nos encontros				%	
Marcos críticos concluídos				%	
Satisfação por etapa				0 a 10	
Horas de Ana e Pedro				Horas	
Cases autorizados				Qtd.	
DIÁRIO		SEMANAL		D30, D60, D90	
Leads, respostas e agenda		Funil, conteúdo, caixa e capacidade		Revisão estratégica completa	

RISCOS E CONTROLES

Escala premium exige mecanismos explícitos para impedir dispersão de marca, perda de dados e degradação da clínica.

01 MENSAGEM AMPLA Controle: filtro +R\$30 mil/mês, anti-ICP e linguagem de gestão.	02 CONTEÚDO ATRAI SOMENTE PACIENTES Controle: séries, CTAs, páginas e CRM separados para B2C e B2B.
03 FUNDADORES VIRAM GARGALO Controle: captação delegada, blocos fixos, CS e limite de 8 empresas.	04 CRM VIRA AGENDA PASSIVA Controle: responsável, próxima ação, data e auditoria diária.
05 OFERTA ARTESANAL DEMAIS Controle: escopo, contrato, SLA e backlog para demandas extras.	06 ESCALA ANTES DA CONVERSÃO Controle: mídia paga somente após os gates orgânicos e comerciais.
07 RISCO ÉTICO OU CLÍNICO Controle: revisão de compliance, consentimento e normas vigentes.	08 QUEDA DA OPERAÇÃO CLÍNICA Controle: dashboard separado e capacidade protegida antes de nova turma.

DEZ DECISÕES

DECISÕES CONCLUÍDAS

0/10

O plano entra em execução somente quando produto, capacidade e governança estiverem fechados.

LIMPAR PROGRESSO

Checklist executivo para os primeiros seis dias. O progresso fica salvo apenas neste navegador e não envia dados para nenhum sistema.

☐	Nome e descriptor público Definir Instituto Rego, Rego Academy ou nome próprio da mentoria.	ATÉ D6
☐	ICP e especialidades prioritárias Confirmar faixa, nicho e critérios de desqualificação.	ATÉ D6
☐	Duração, capacidade e calendário Confirmar 12 semanas, limite de 8 e datas da turma.	ATÉ D6
☐	Condições comerciais Definir pagamento do investimento de R\$ 18 mil.	ATÉ D6
☐	Divisão Ana e Pedro Determinar papéis em conteúdo, venda e entrega.	ATÉ D6
☐	SLA e limites de suporte Definir canal, horário, responsável e demandas fora do escopo.	ATÉ D6
☐	Donos do CRM e conteúdo Nomear responsáveis com rotina de auditoria.	ATÉ D6
☐	Cases e autorizações Selecionar números, imagens e provas com consentimento.	ATÉ D6
☐	Masterclass e início da turma Fixar datas de captação, oferta direta e onboarding.	ATÉ D6
☐	Definição das metas financeiras Separar clínica, mentoria, receita contratada, caixa e horizonte anual.	ATÉ D6

FOCO PRIMEIRO. ESCALA DEPOIS.

1. Fechar ICP acima de R\$ 30 mil/mês.
2. Aprovar uma única oferta de R\$ 18 mil.
3. Instalar CRM, aplicação e rastreamento.
4. Operar Ana e Pedro como autoridades complementares.
5. Publicar 10 conteúdos por semana no mix 40/40/20.
6. Executar oferta direta antes da abertura pública.
7. Usar a primeira turma para gerar prova, margem e repetibilidade.
